































































Id		Modo de tarea	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			0%	Final Project	92 días	mié 23/01/19	mié 12/06/19	
2			0%	Define Objective	1 día	mié 23/01/19	mié 23/01/19	
3			0%	Sketch	2 días	jue 24/01/19	vie 25/01/19	2
4			0%	Definition of Story to develop	5 días	lun 28/01/19	vie 01/02/19	3
5			0%	Definition of Characters	5 días	mar 05/02/19	lun 11/02/19	4
6			0%	Scenario	48 días	mié 30/01/19	mar 09/04/19	
7			0%	CAD for scenario	5 días	mié 30/01/19	mié 06/02/19	
8			0%	CNC cutting and building	5 días	jue 07/02/19	mié 13/02/19	7
9			0%	Scenario finishing touches	15 días	jue 14/02/19	mié 06/03/19	8
10			0%	Electronics	38 días	jue 14/02/19	mar 09/04/19	8
11			0%	Definition of mechanisms to move characters	9 días	jue 14/02/19	mar 26/02/19	7
12			0%	Electronics design for grid	5 días	mié 27/02/19	mar 05/03/19	11
13			0%	Electronics to sync with app - input	5 días	mié 27/03/19	mar 02/04/19	12
14			0%	Electronics to sync with app - output	5 días	mié 03/04/19	mar 09/04/19	13
15			0%	App Development	61 días	mié 20/02/19	vie 24/05/19	
16			0%	App Mock-Up	3 días	mié 20/02/19	vie 22/02/19	4
17			0%	Scenography Design	5 días	lun 25/02/19	vie 01/03/19	16
18			0%	Data Base definition	3 días	lun 04/03/19	mié 06/03/19	17
19			0%	App Architecture	5 días	jue 07/03/19	mié 13/03/19	18
20			0%	Development of menus	5 días	jue 14/03/19	jue 21/03/19	19
21			0%	Development of Scenographies	10 días	vie 22/03/19	jue 04/04/19	20
22			0%	Synchronization of audio	10 días	vie 05/04/19	jue 25/04/19	21
23			0%	Synchronization subtitles	10 días	vie 26/04/19	vie 10/05/19	22

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
Fecha: vie 25/01/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
24			0%	App Testing	10 días	lun 13/05/19	vie 24/05/19	23
25			0%	Control Sync with Electronics	15 días	mié 10/04/19	mié 08/05/19	14
26			0%	Characters	30 días	mar 12/02/19	mar 26/03/19	
27			0%	Definition of technique to be used	6 días	mar 12/02/19	mar 19/02/19	5
28			0%	3D printing of characters	5 días	mié 20/02/19	mar 26/02/19	27
29			0%	Molding and casting of characters	5 días	mié 20/03/19	mar 26/03/19	28
30			0%	Character's finishing touches	15 días	mié 27/02/19	mié 20/03/19	28
31			0%	Integral testing	10 días	lun 27/05/19	vie 07/06/19	24,25,30,9,14
32			0%	Presentation Preparation	2 días	lun 10/06/19	mar 11/06/19	31
33			0%	Presentation	0 días	mié 12/06/19	mié 12/06/19	32
34			0%	Assignments	93 días	mié 23/01/19	mié 12/06/19	
35			0%	W2: Project Management	5 días	mié 23/01/19	mar 29/01/19	
36			0%	Web Page Structure	5 días	mié 23/01/19	mar 29/01/19	
37			0%	Set first baseline	5 días	mié 23/01/19	mar 29/01/19	
38			0%	W3: CAD	4 días	mié 30/01/19	mar 05/02/19	
39			0%	Individual Activity	4 días	mié 30/01/19	mar 05/02/19	36,37
40			0%	Update Week 3 Individual activity	0 días	mar 05/02/19	mar 05/02/19	39
41			0%	W4: CNC Cutting	5 días	mié 06/02/19	mar 12/02/19	
42			0%	Group activity	1 día	mié 06/02/19	mié 06/02/19	40
43			0%	Update week 4: Group Activity	0 días	mié 06/02/19	mié 06/02/19	42
44			0%	Individual activity	4 días	jue 07/02/19	mar 12/02/19	43
45			0%	Update Week 4: Individual Activity	0 días	mar 12/02/19	mar 12/02/19	44
46			0%	W5: Electronics Production	5 días	mié 13/02/19	mar 19/02/19	


































Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
Fecha: vie 25/01/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
47			0%	Individual Activity	5 días	mié 13/02/19	mar 19/02/19	45
48			0%	Update week5: Individual Activy	0 días	mar 19/02/19	mar 19/02/19	47
49			0%	W6: 3D Scanning and Printing	5 días	mié 20/02/19	mar 26/02/19	
50			0%	Group Activity	1 día	mié 20/02/19	mié 20/02/19	48
51			0%	Update Week 5: Group Activity	0 días	mié 20/02/19	mié 20/02/19	50
52			0%	Individual Activity	4 días	jue 21/02/19	mar 26/02/19	51
53			0%	Update week 5: Individual Activity	0 días	mar 26/02/19	mar 26/02/19	52
54			0%	W7: Electronic Design	5 días	mié 27/02/19	mar 05/03/19	
55			0%	Group Activity	1 día	mié 27/02/19	mié 27/02/19	53
56			0%	Update week6: Group Activity	0 días	mié 27/02/19	mié 27/02/19	55
57			0%	Individual Activity	4 días	jue 28/02/19	mar 05/03/19	56
58			0%	Update week 6 : Individual Activity	0 días	mar 05/03/19	mar 05/03/19	57
59			0%	W8: CNC Maching	5 días	mié 06/03/19	mar 12/03/19	
60			0%	Group Activity	1 día	mié 06/03/19	mié 06/03/19	58
61			0%	Update week 8: group activity	0 días	mié 06/03/19	mié 06/03/19	60
62			0%	Individual Activity - Make something big	4 días	jue 07/03/19	mar 12/03/19	61
63			0%	Update week 8: individual activity	0 días	mar 12/03/19	mar 12/03/19	62
64			0%	W9: Embedded Programming	4 días	mié 13/03/19	mar 19/03/19	
65			0%	Group Activity	1 día	mié 13/03/19	mié 13/03/19	63
66			0%	Update week 9: Group activity	0 días	mié 13/03/19	mié 13/03/19	65
67			0%	Individual Activity	3 días	jue 14/03/19	mar 19/03/19	66
68			0%	Update week 9: Individual activity	0 días	mar 19/03/19	mar 19/03/19	67
69			0%	W10: Molding and Casting	5 días	mié 20/03/19	mar 26/03/19	

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
Fecha: vie 25/01/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
70			0%	Group Activity	1 día	mié 20/03/19	mié 20/03/19	68
71			0%	update week 10: group activity	0 días	mié 20/03/19	mié 20/03/19	70
72			0%	Individual Activity	4 días	jue 21/03/19	mar 26/03/19	71
73			0%	update week 10: individual activity	0 días	mar 26/03/19	mar 26/03/19	72
74			0%	W11: Input Devices	5 días	mié 27/03/19	mar 02/04/19	
75			0%	Group Activity	1 día	mié 27/03/19	mié 27/03/19	73
76			0%	Update week 11: Group activity	0 días	mié 27/03/19	mié 27/03/19	75
77			0%	Individual Activity	4 días	jue 28/03/19	mar 02/04/19	76
78			0%	Update week 11: individual activity	0 días	mar 02/04/19	mar 02/04/19	77
79			0%	W12: Output Devices	5 días	mié 03/04/19	mar 09/04/19	
80			0%	Group Activity	1 día	mié 03/04/19	mié 03/04/19	78
81			0%	Update week 12: group activity	0 días	mié 03/04/19	mié 03/04/19	80
82			0%	Individual Activity	4 días	jue 04/04/19	mar 09/04/19	81
83			0%	Update week 12: individual activity	0 días	mar 09/04/19	mar 09/04/19	82
84			0%	W13: Applications and Implications	5 días	mié 10/04/19	mar 23/04/19	
85			0%	Individual Activity	5 días	mié 10/04/19	mar 23/04/19	83
86			0%	Update week 13: Individual activity	0 días	mar 23/04/19	mar 23/04/19	85
87			0%	W14: Networking and Communications	5 días	mié 24/04/19	mar 30/04/19	
88			0%	Group Activity	1 día	mié 24/04/19	mié 24/04/19	86
89			0%	Update week 14: group activity	0 días	mié 24/04/19	mié 24/04/19	88
90			0%	Individual Activity	4 días	jue 25/04/19	mar 30/04/19	89
91			0%	update week 14: individual activity	0 días	mar 30/04/19	mar 30/04/19	90
92			0%	W15: Mechanical Design	5 días	jue 02/05/19	mié 08/05/19	


Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
Fecha: vie 25/01/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
93			0%	Group Activity	5 días	jue 02/05/19	mié 08/05/19	91
94			0%	Update week 15: group activity	0 días	mié 08/05/19	mié 08/05/19	93
95			0%	W16: Interface and Application Programming	5 días	jue 09/05/19	mié 15/05/19	
96			0%	Group Activity	1 día	jue 09/05/19	jue 09/05/19	94
97			0%	update week 16: group activity	0 días	jue 09/05/19	jue 09/05/19	96
98			0%	Individual Activity	4 días	vie 10/05/19	mié 15/05/19	97
99			0%	Update week 16: individual activity	0 días	mié 15/05/19	mié 15/05/19	98
100			0%	W17: Machine Design	4 días	jue 16/05/19	mar 21/05/19	
101			0%	Group Activity	4 días	jue 16/05/19	mar 21/05/19	99
102			0%	Update week 17: group activity	0 días	mar 21/05/19	mar 21/05/19	101
103			0%	W18: Wildcard Week	4 días	mié 22/05/19	lun 27/05/19	
104			0%	Individual Activity	4 días	mié 22/05/19	lun 27/05/19	102
105			0%	Update week 18: individual activity	0 días	lun 27/05/19	lun 27/05/19	104
106			0%	W19: Invention, Intellectual Property, and Income	4 días	mar 28/05/19	vie 31/05/19	
107			0%	Individual Activity	4 días	mar 28/05/19	vie 31/05/19	105
108			0%	Update week 19: individual activity	0 días	vie 31/05/19	vie 31/05/19	107
109			0%	W20: Project Development	4 días	lun 03/06/19	jue 06/06/19	
110			0%	Individual Activity	4 días	lun 03/06/19	jue 06/06/19	108
111			0%	Update week 20: individual activity	0 días	jue 06/06/19	jue 06/06/19	110
112			0%	W21: Project Presentations	4 días	vie 07/06/19	mié 12/06/19	
113			0%	Individual activity	4 días	vie 07/06/19	mié 12/06/19	111
114			0%	Update week 21: individual activity	0 días	mié 12/06/19	mié 12/06/19	113

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
 Fecha: vie 25/01/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

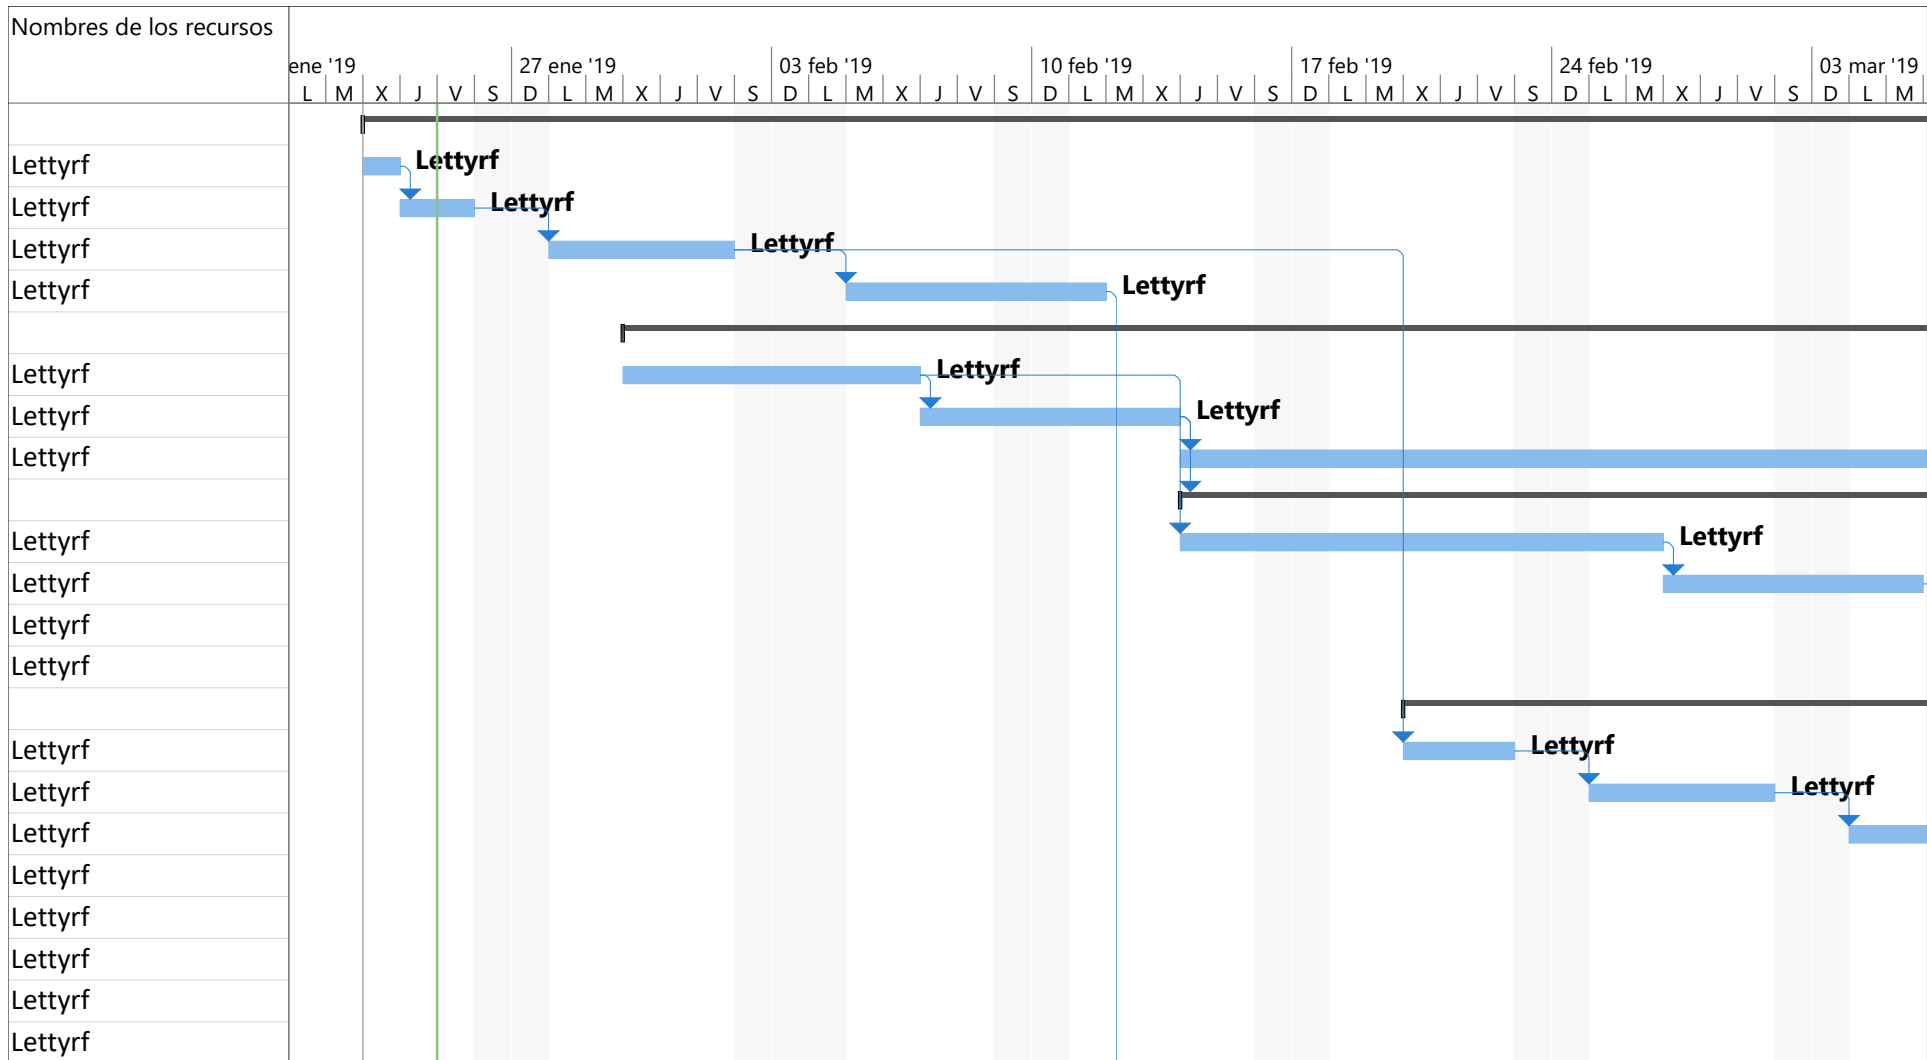

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

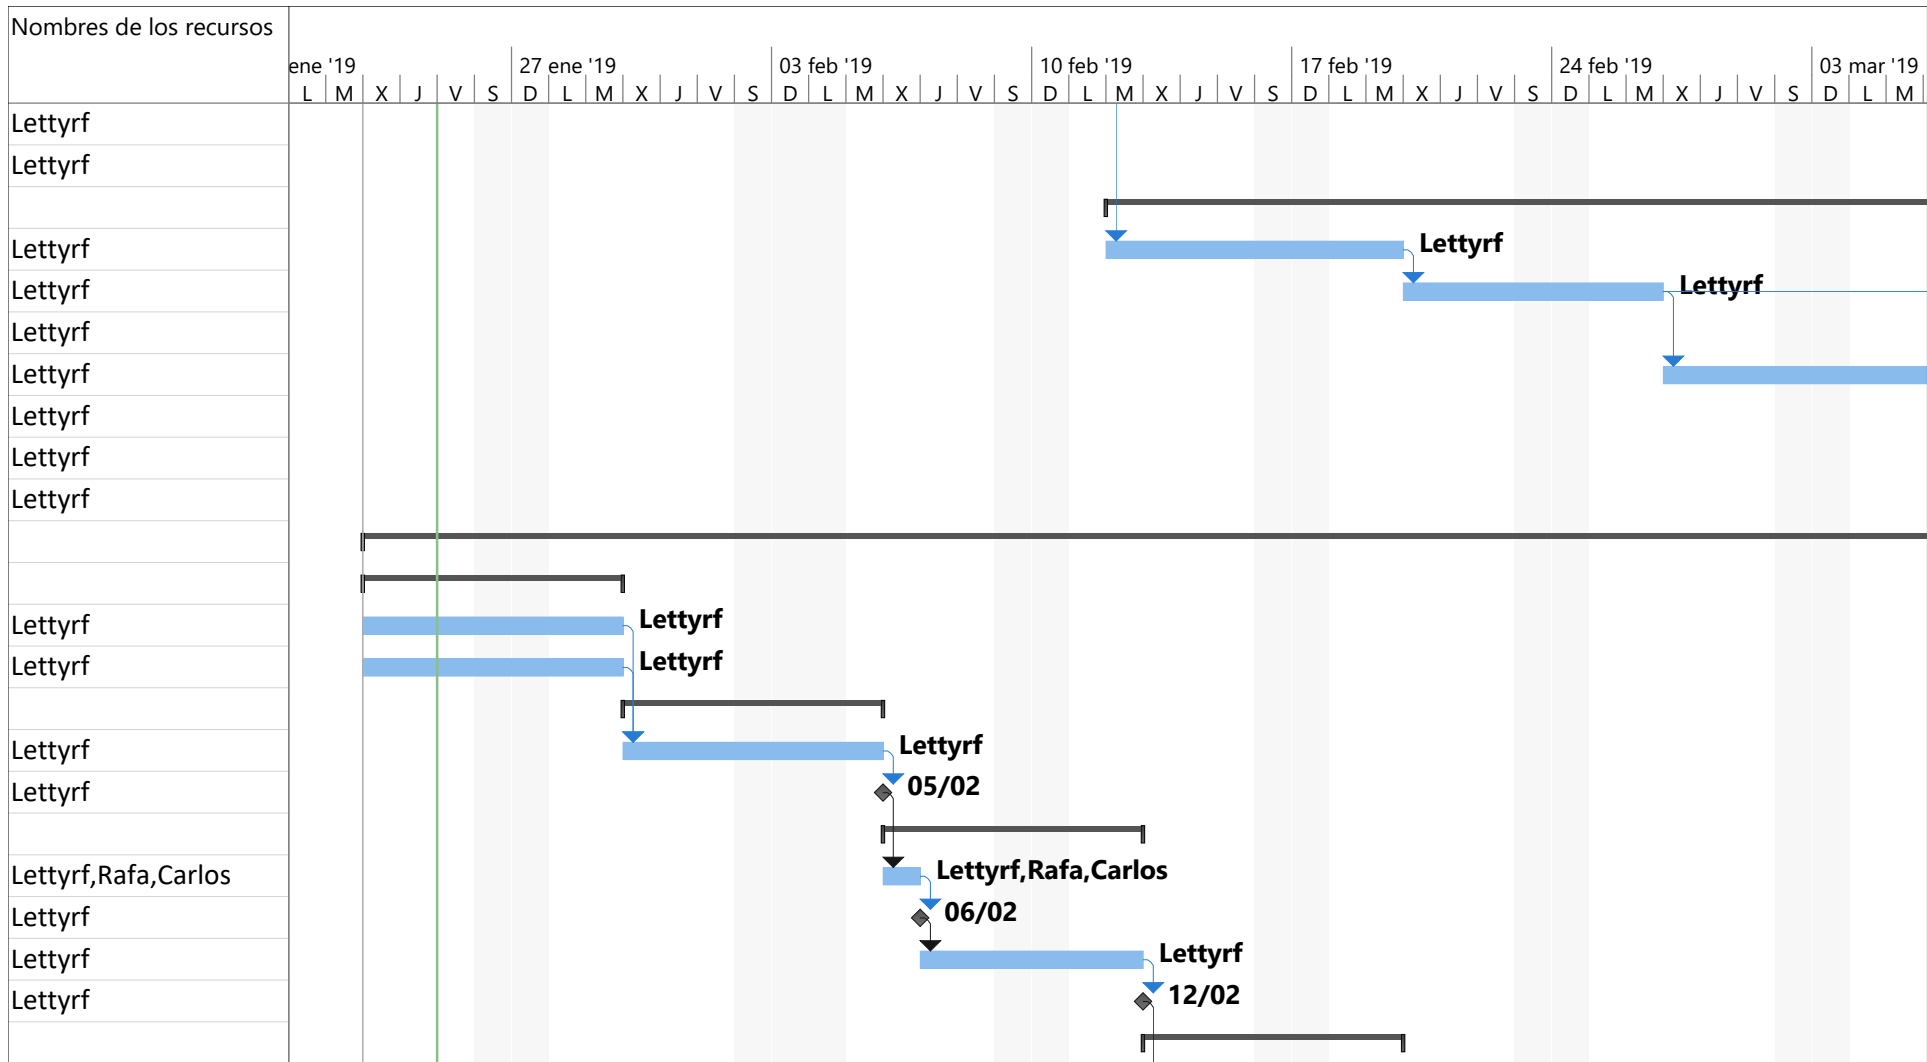

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

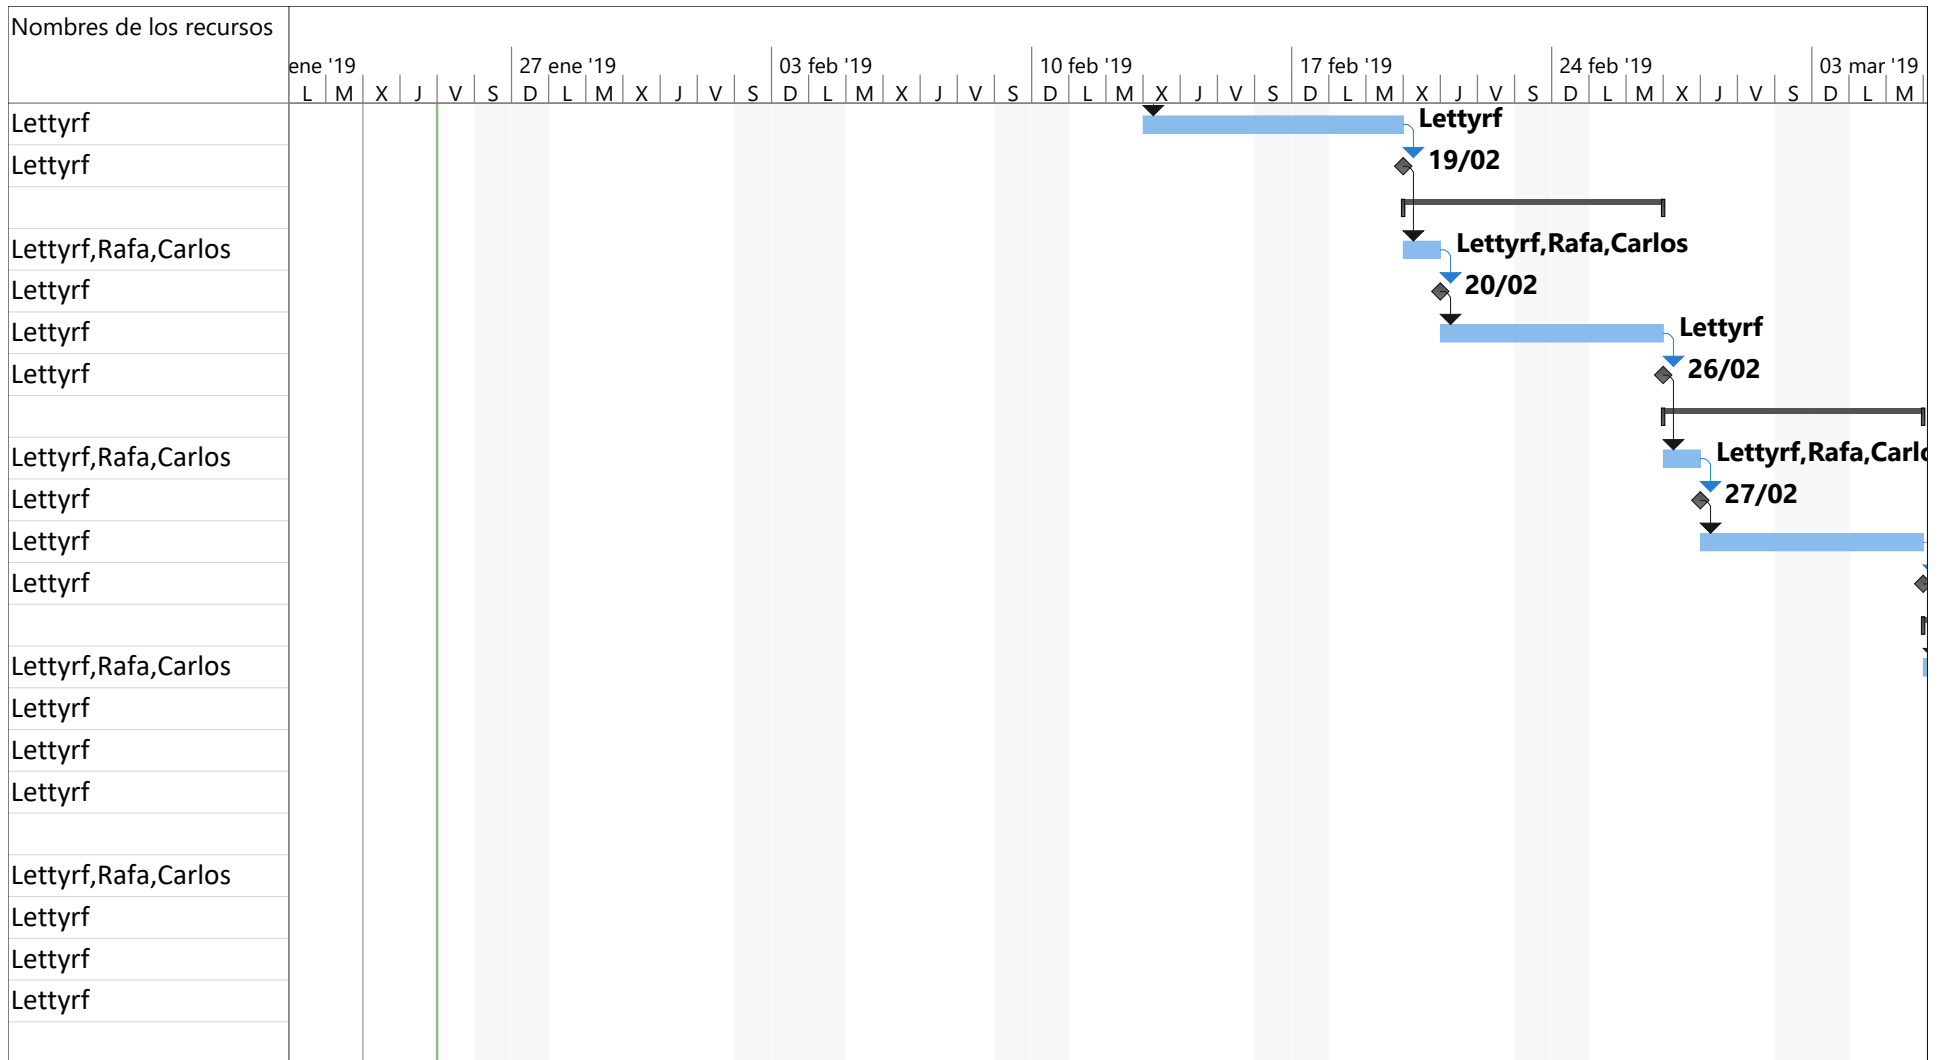

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Nombres de los recursos	ene '19			27 ene '19			03 feb '19			10 feb '19			17 feb '19			24 feb '19			03 mar '19											
	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Nombres de los recursos	ene '19			27 ene '19			03 feb '19			10 feb '19			17 feb '19			24 feb '19			03 mar '19											
	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf,Rafa,Carlos																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														
Lettyrf																														


Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
 Fecha: vie 25/01/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

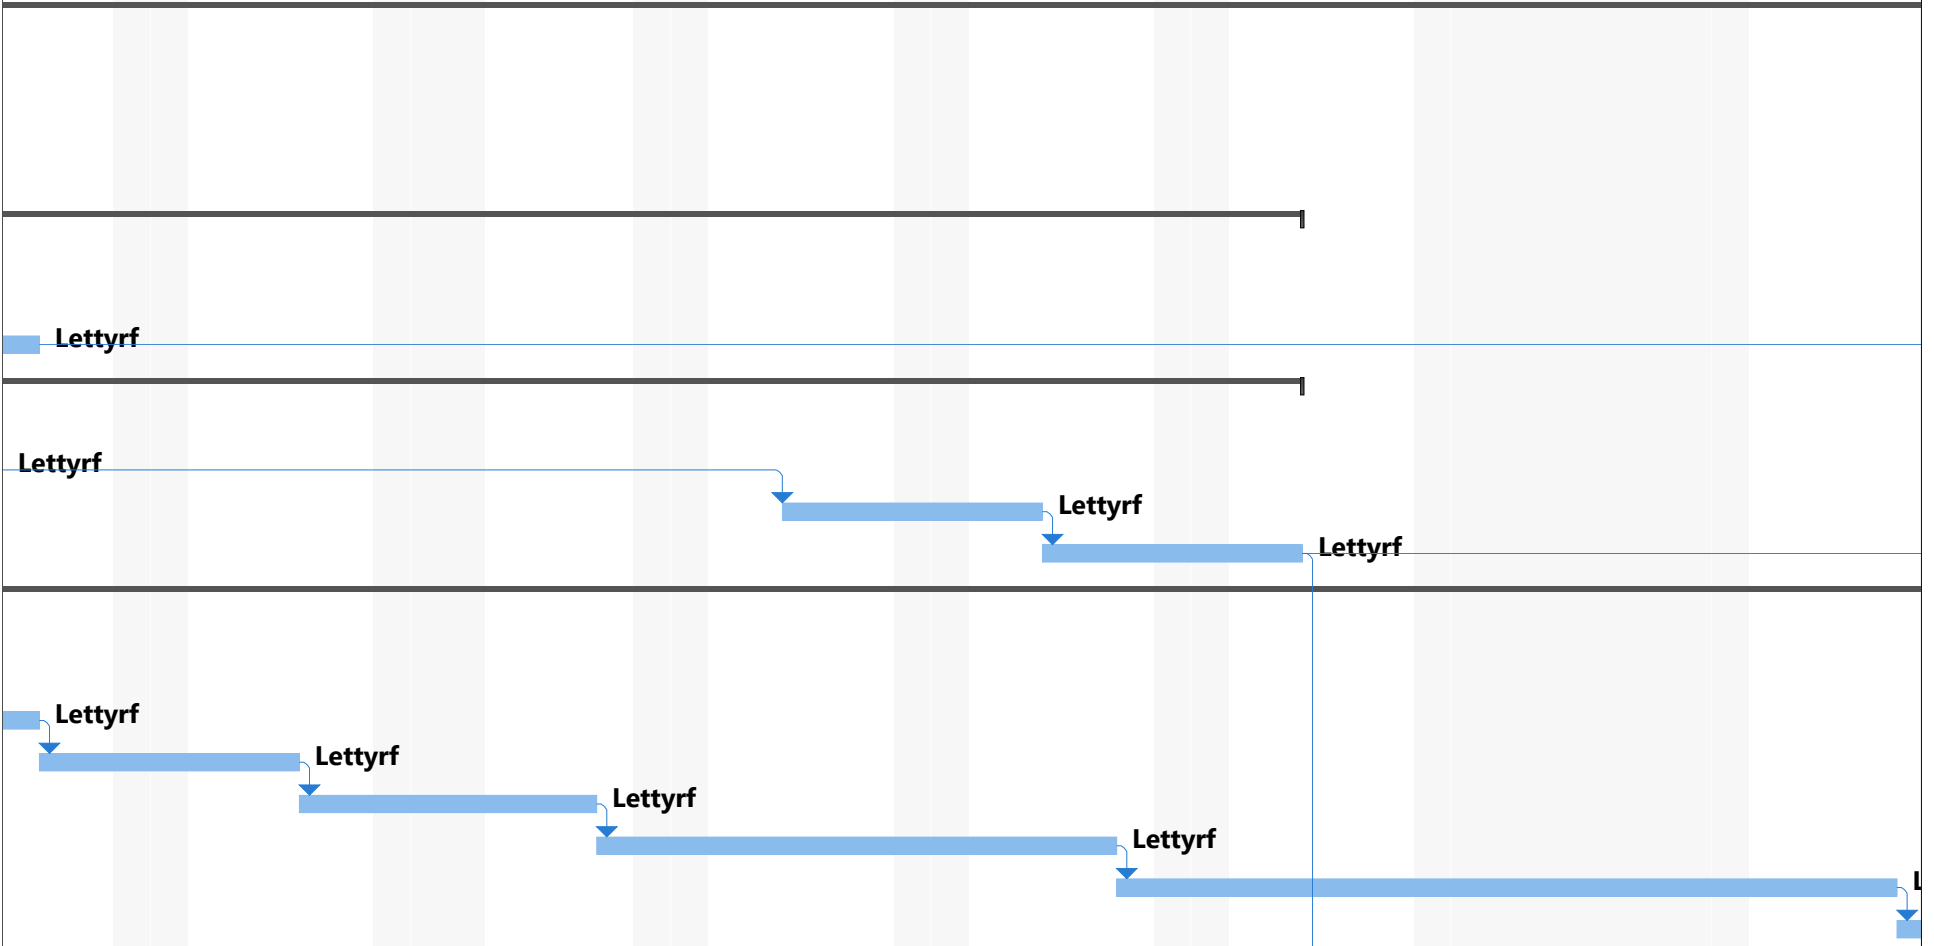


Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
 Fecha: vie 25/01/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

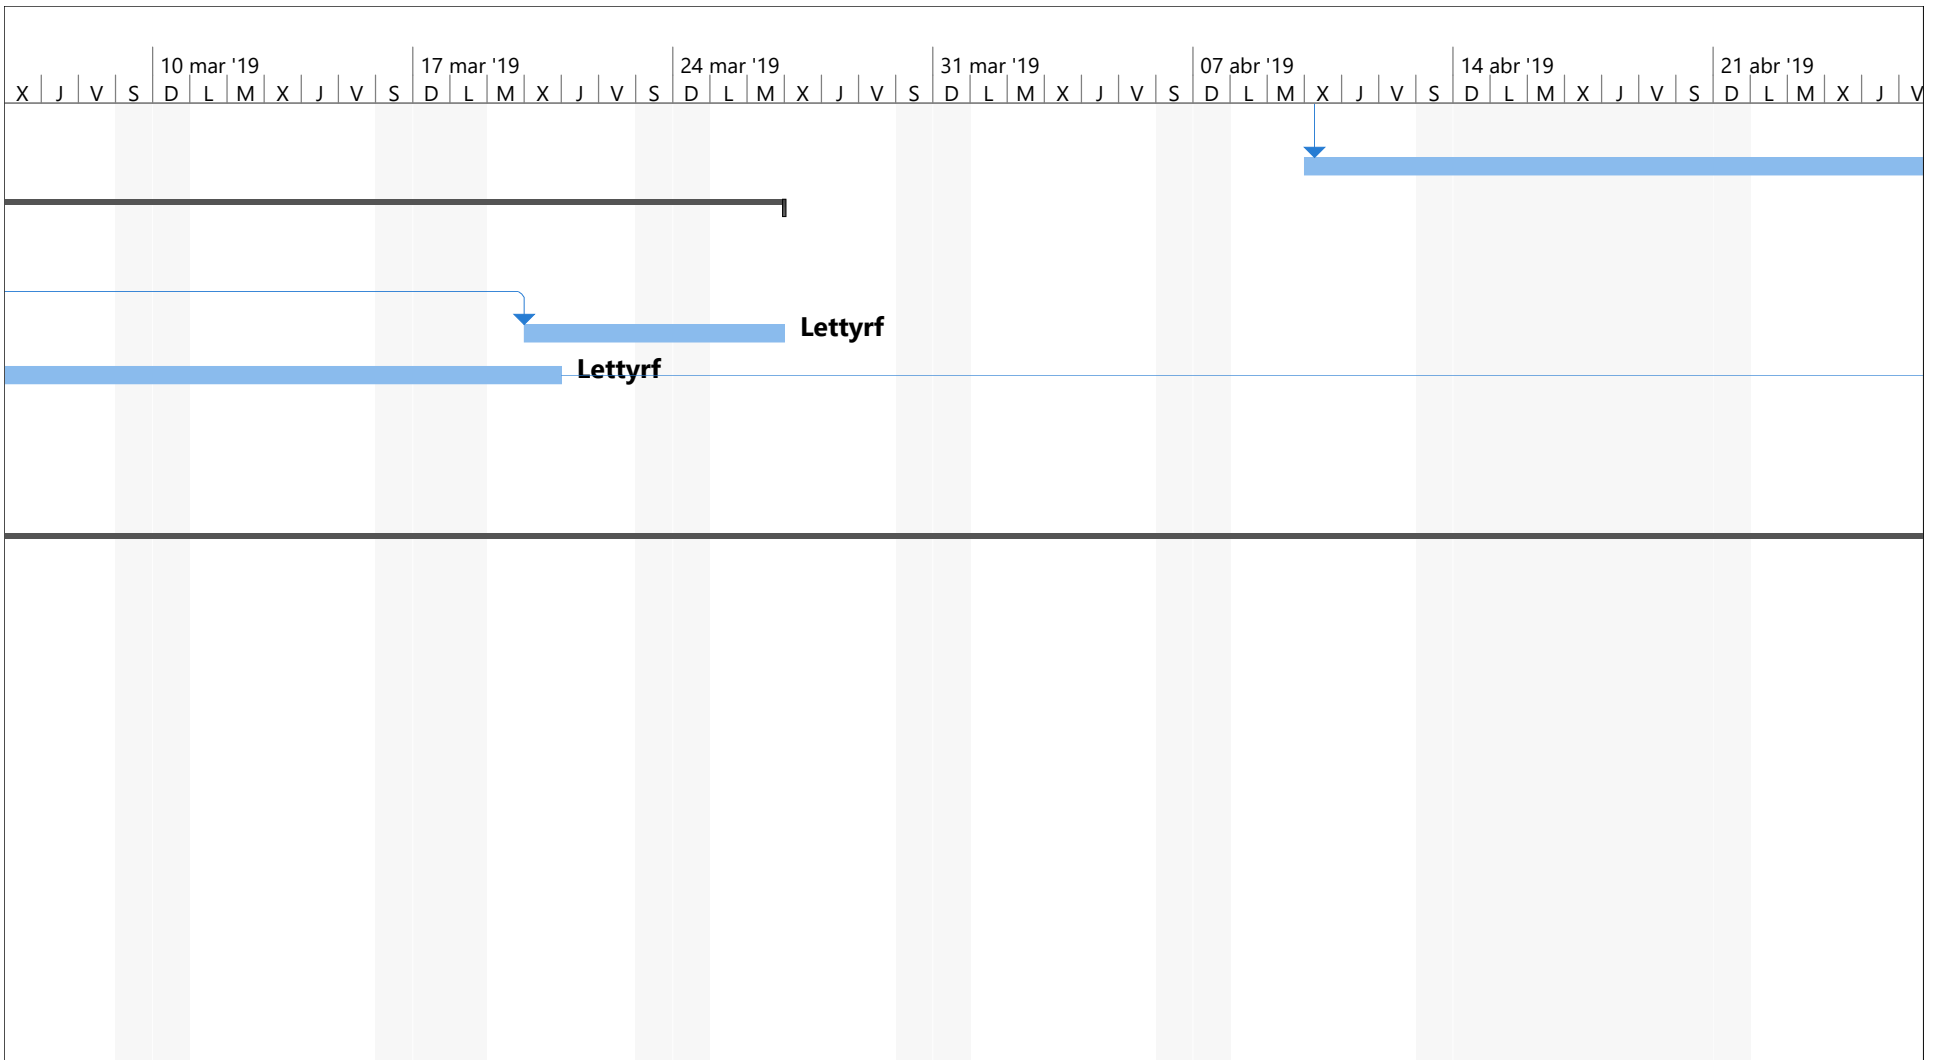


Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

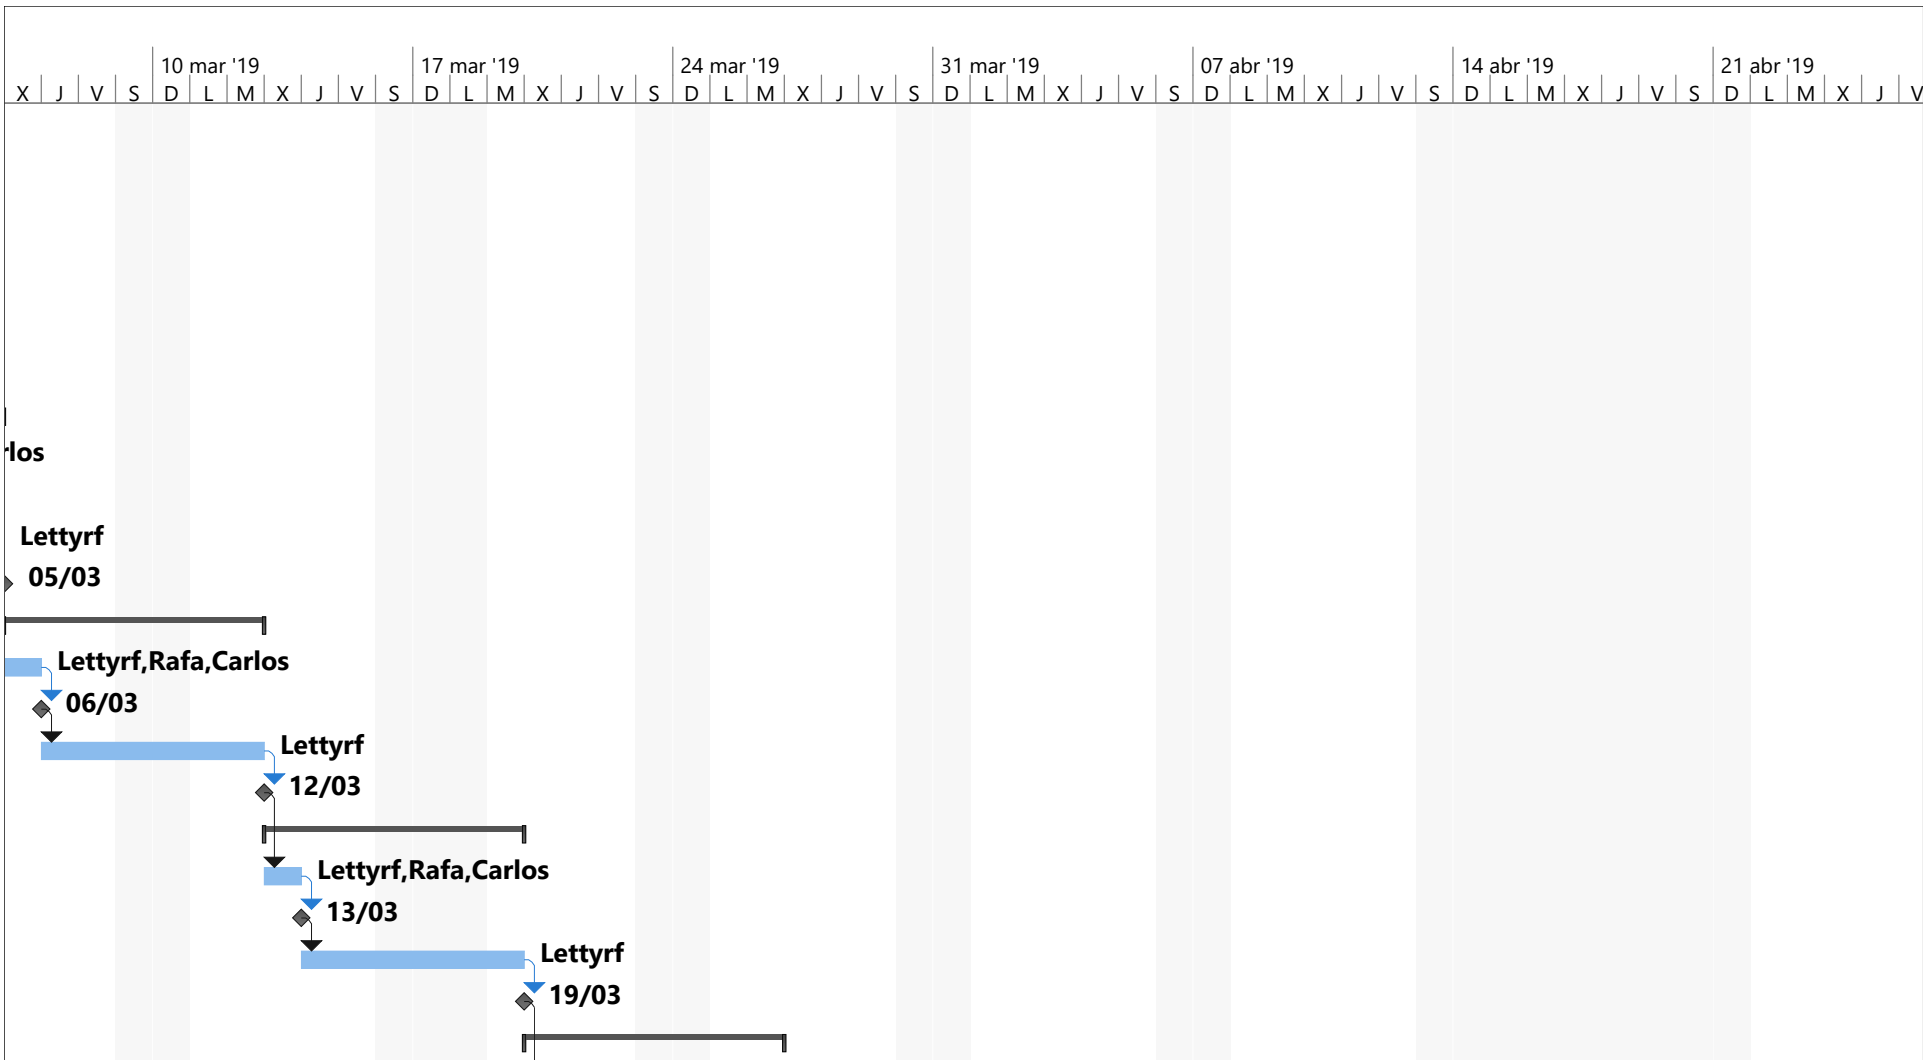




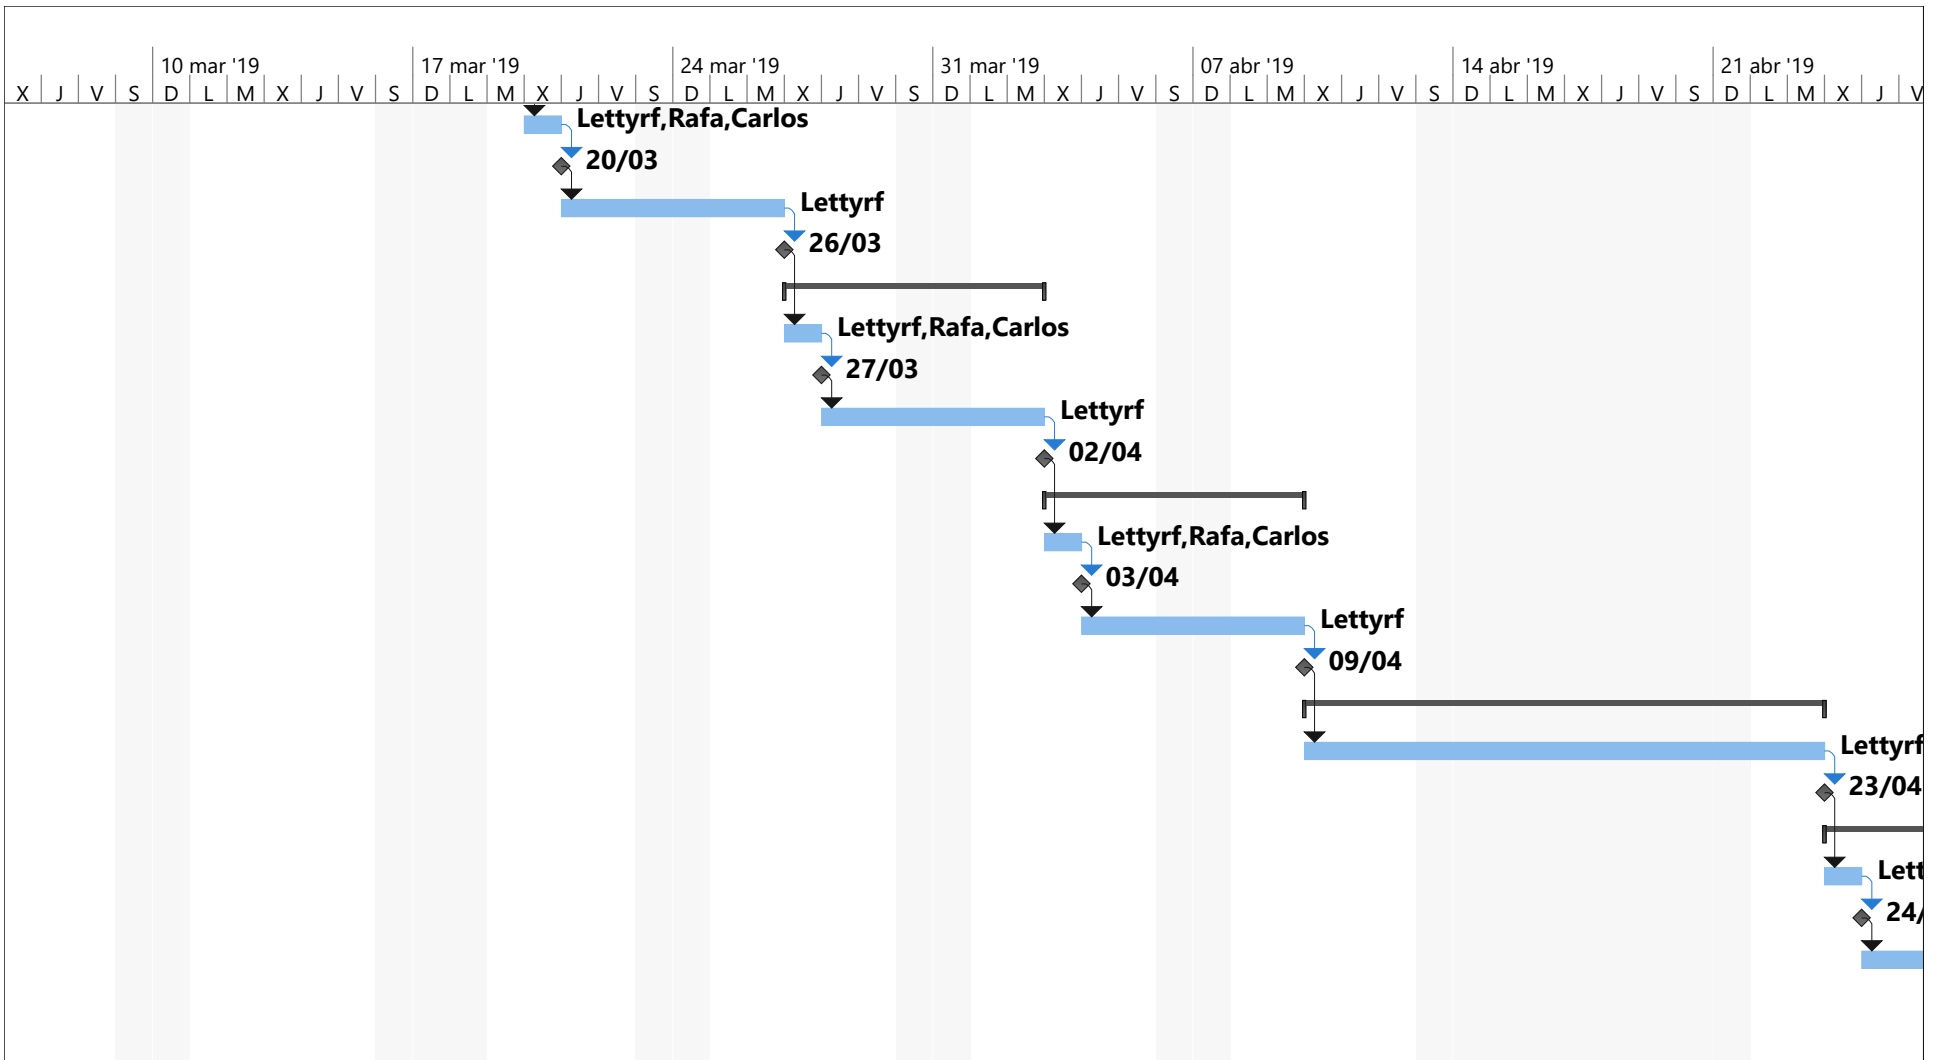



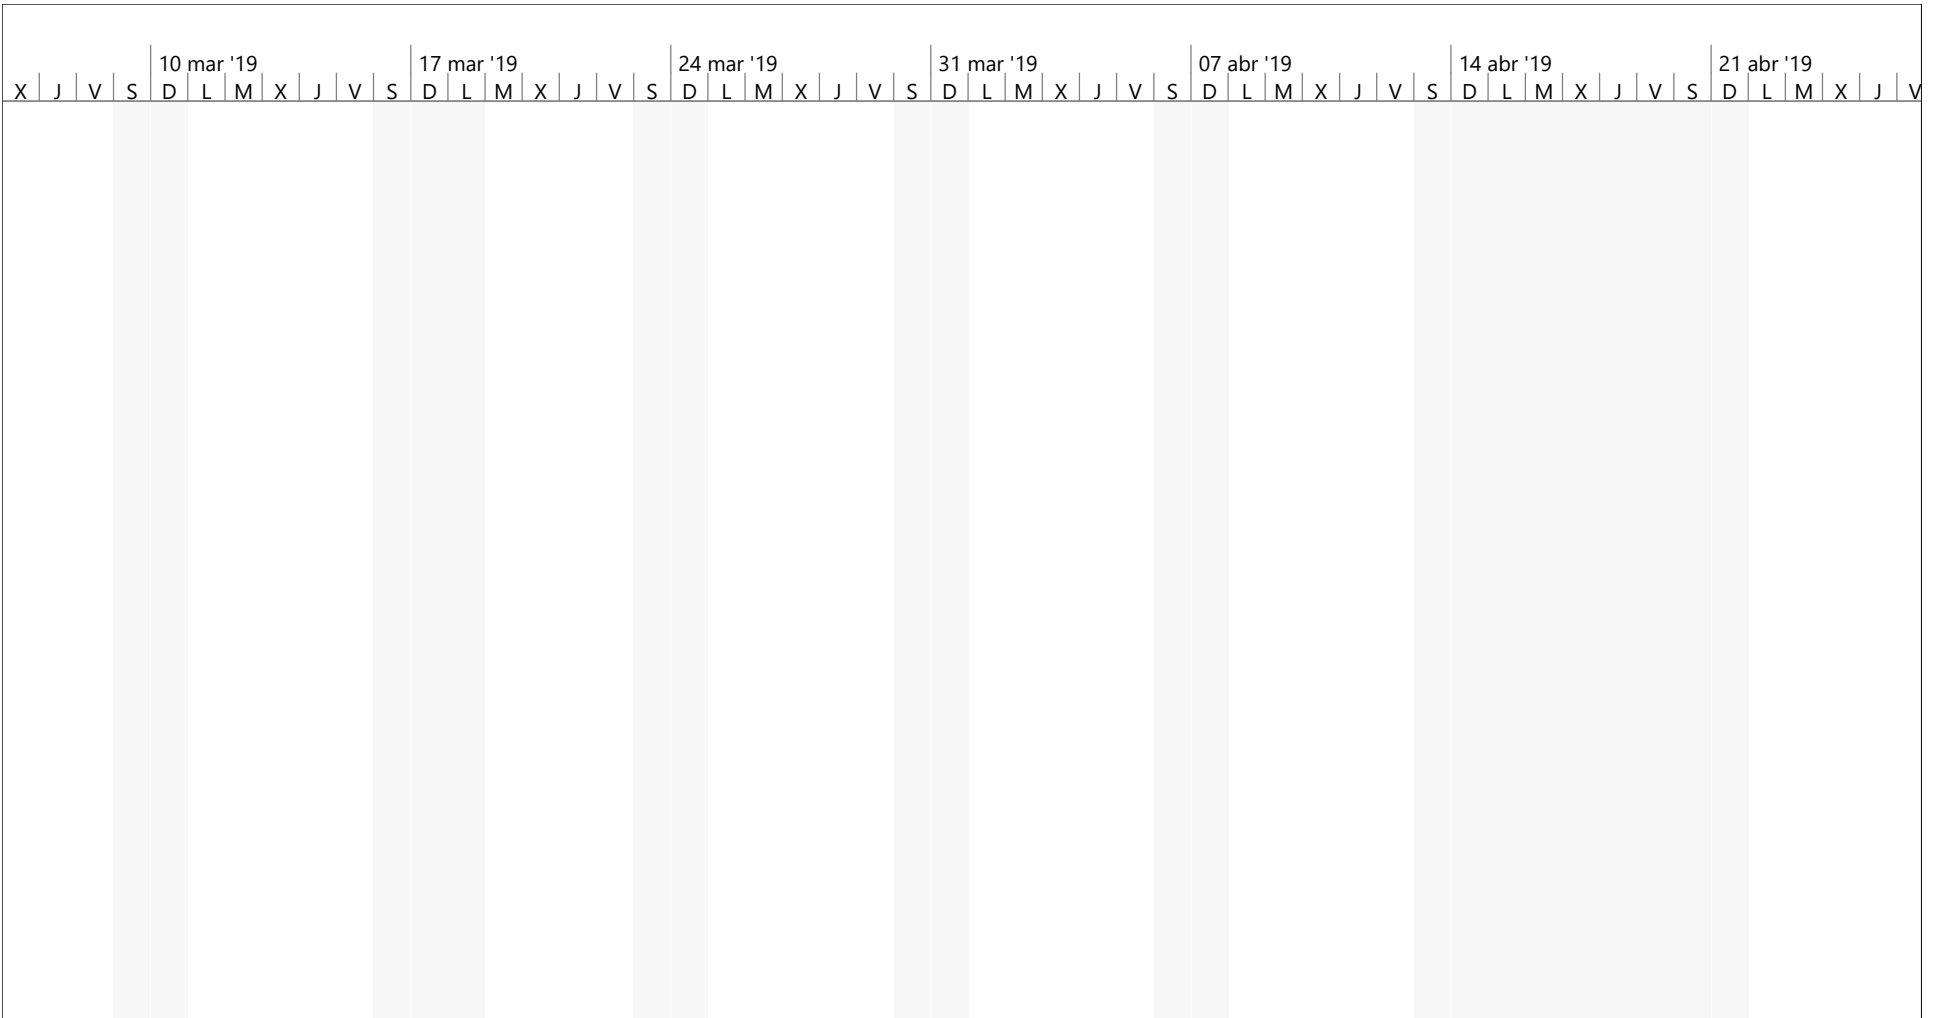











Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				




Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: FirstBaseline_FabAcad
 Fecha: vie 25/01/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

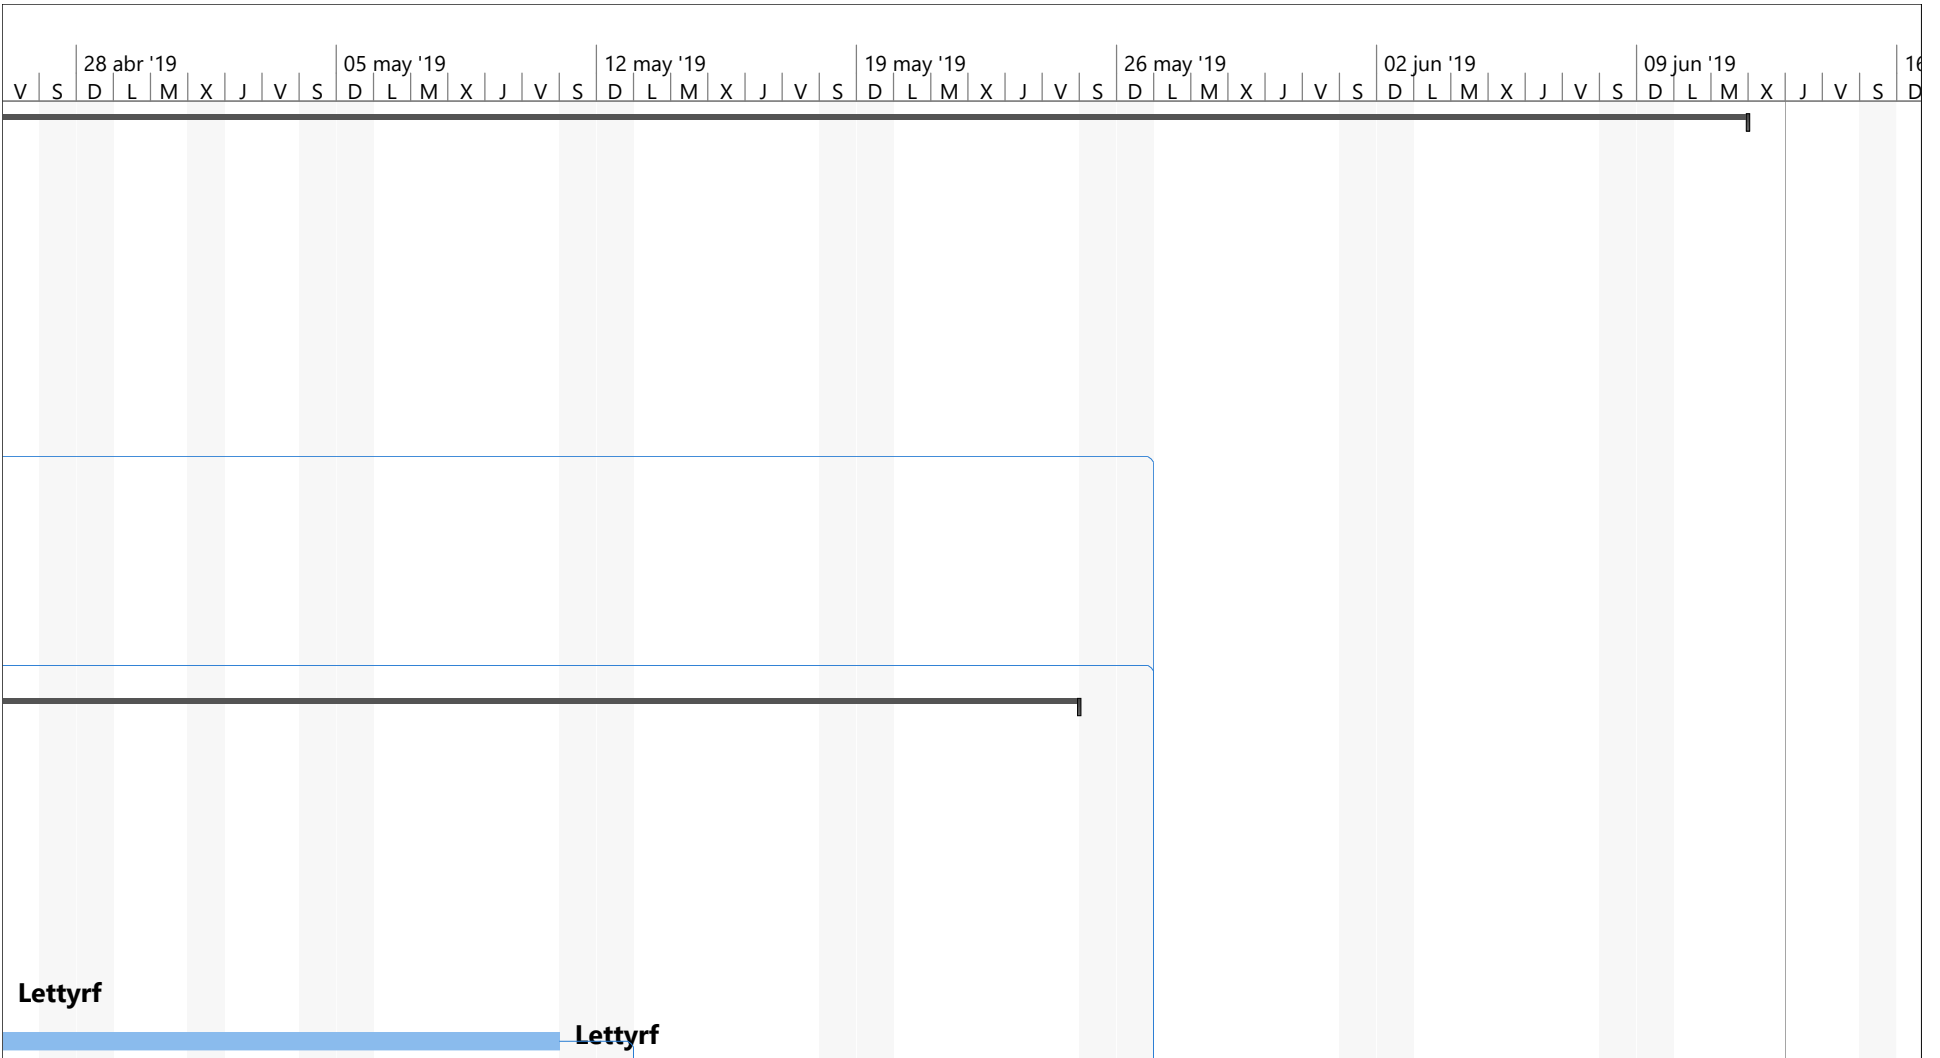


Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

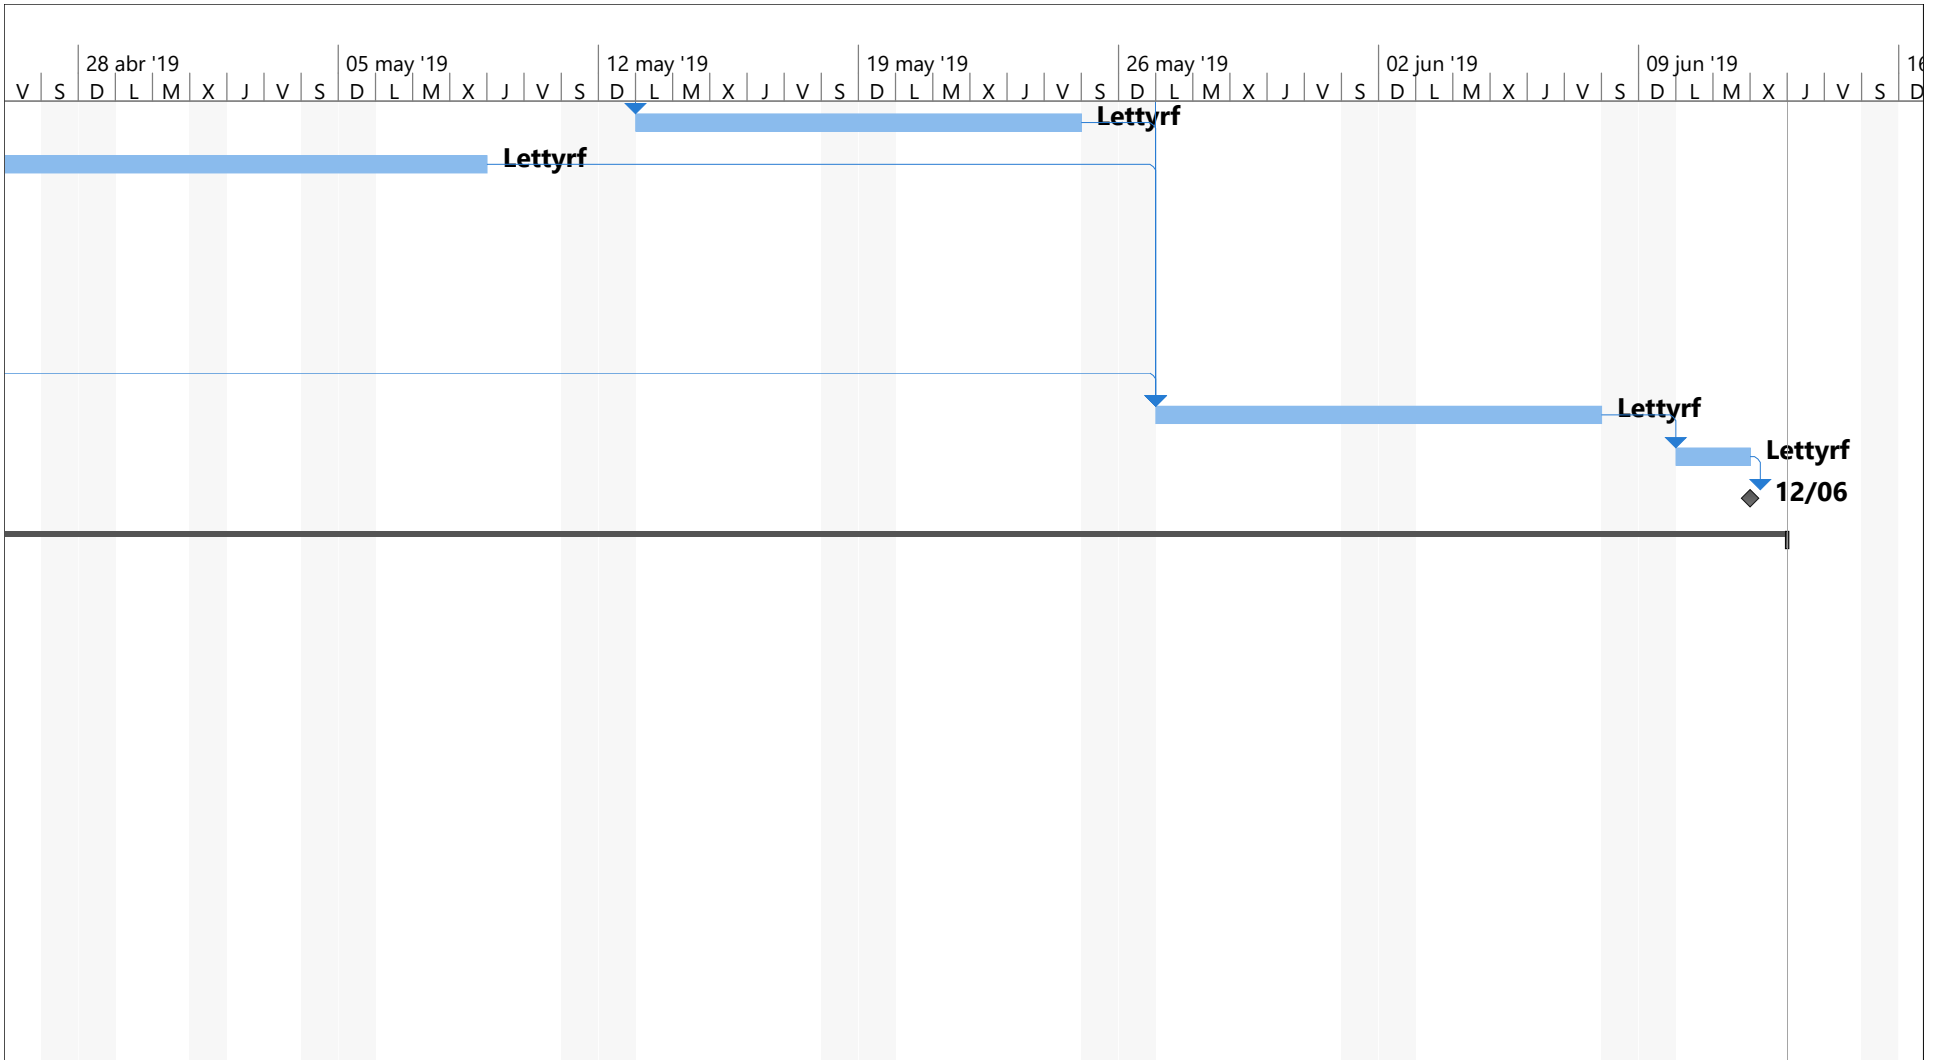


Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

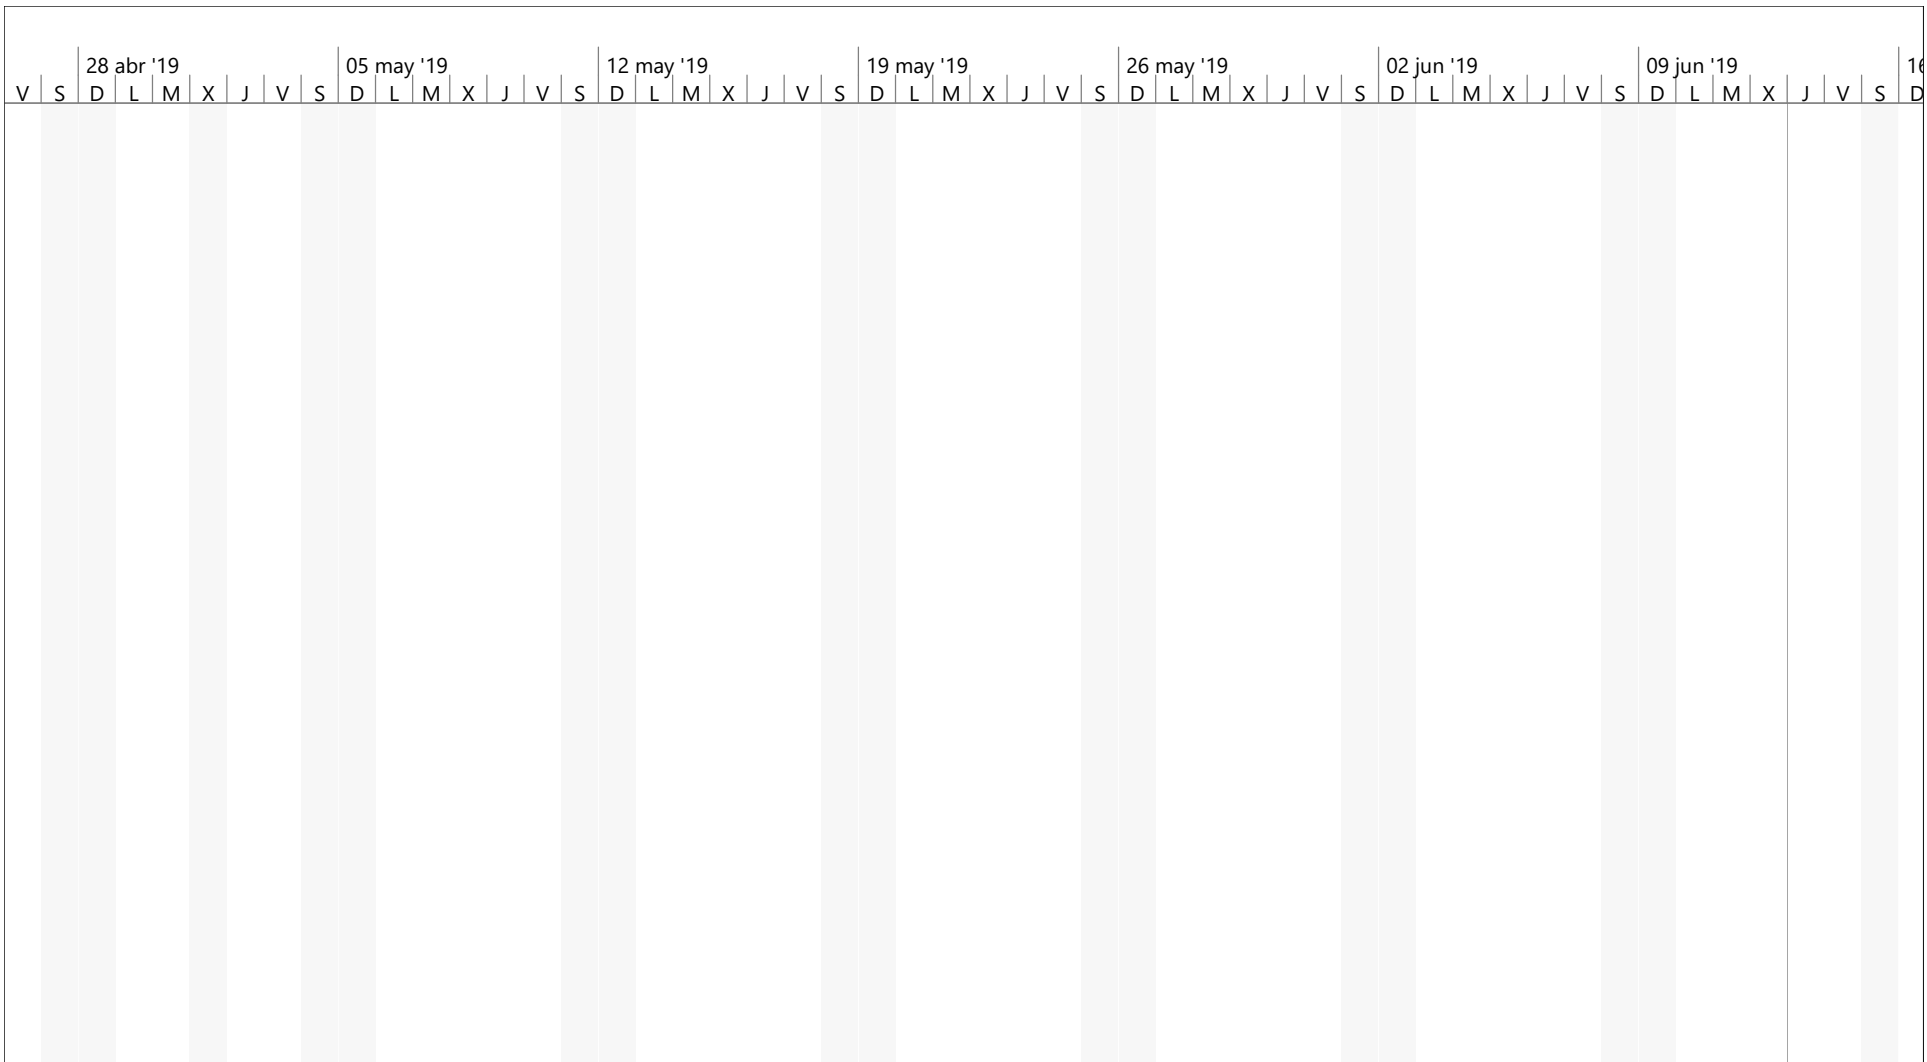

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

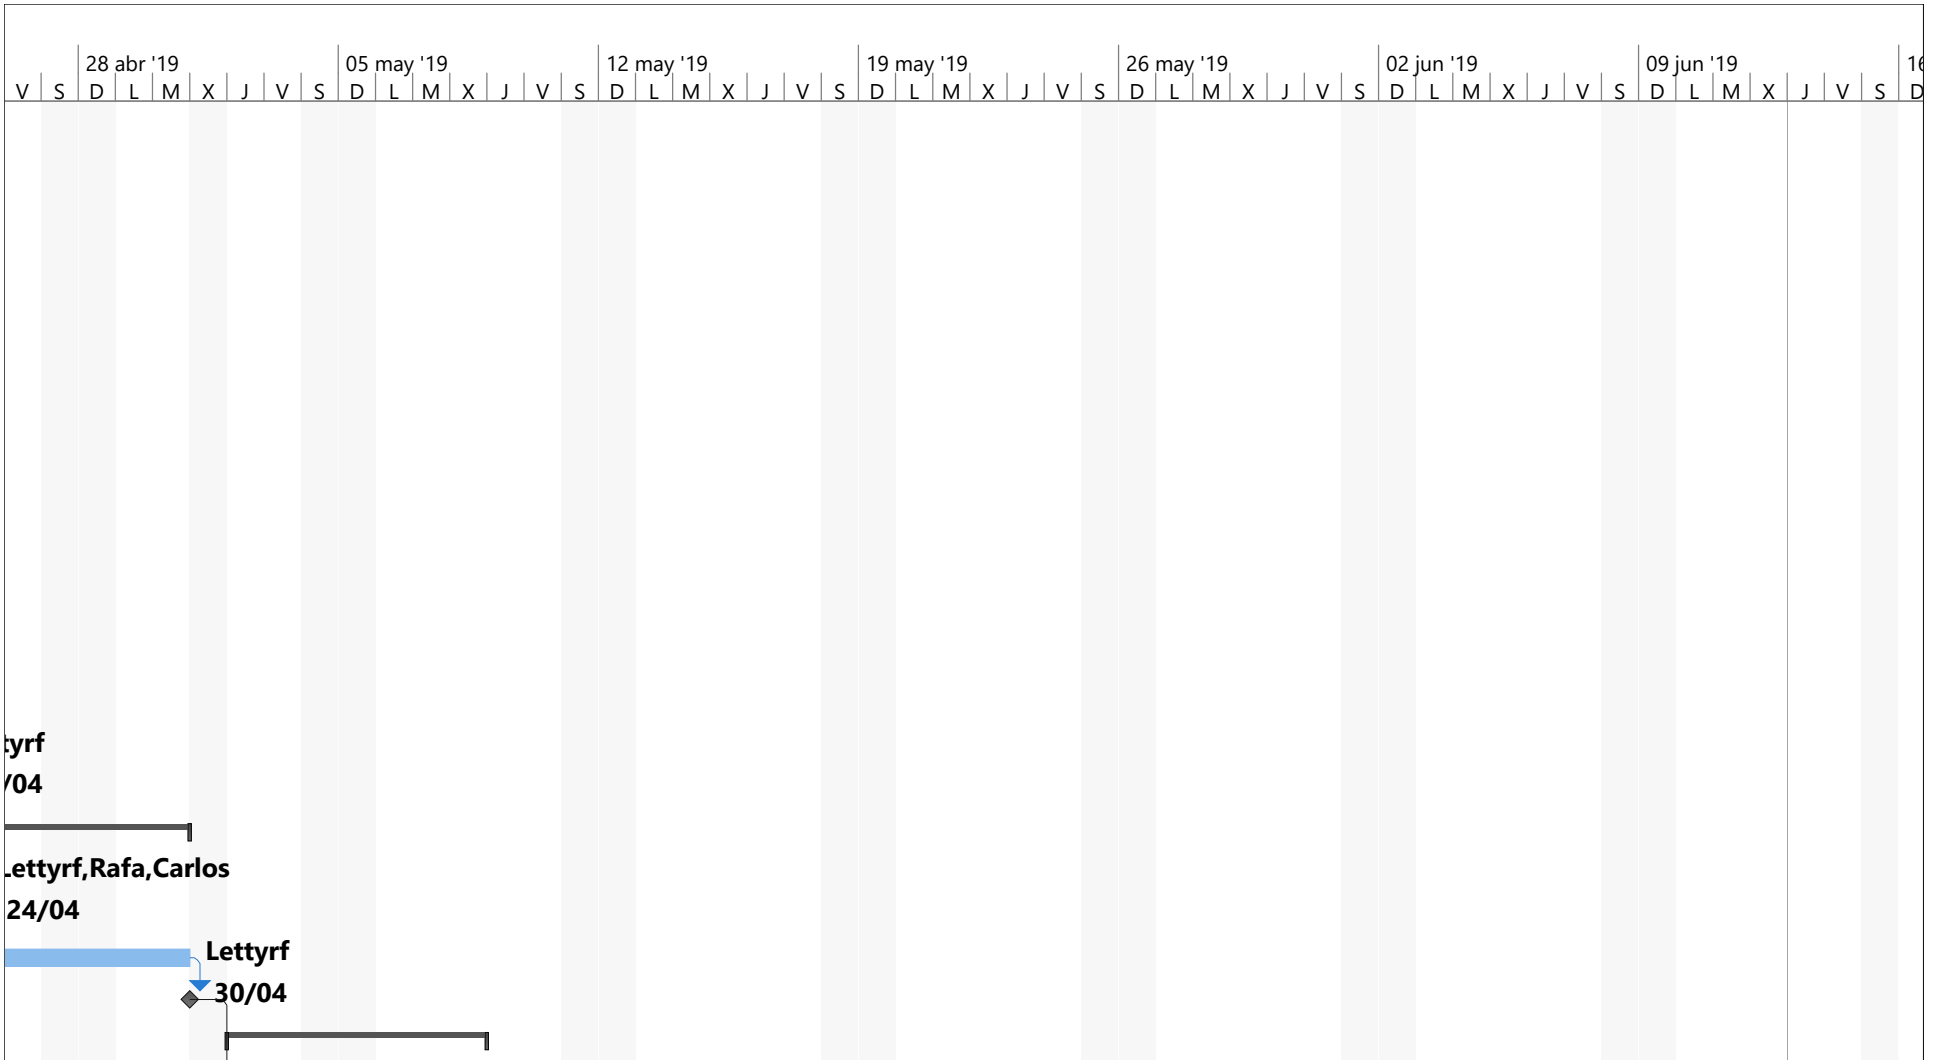

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

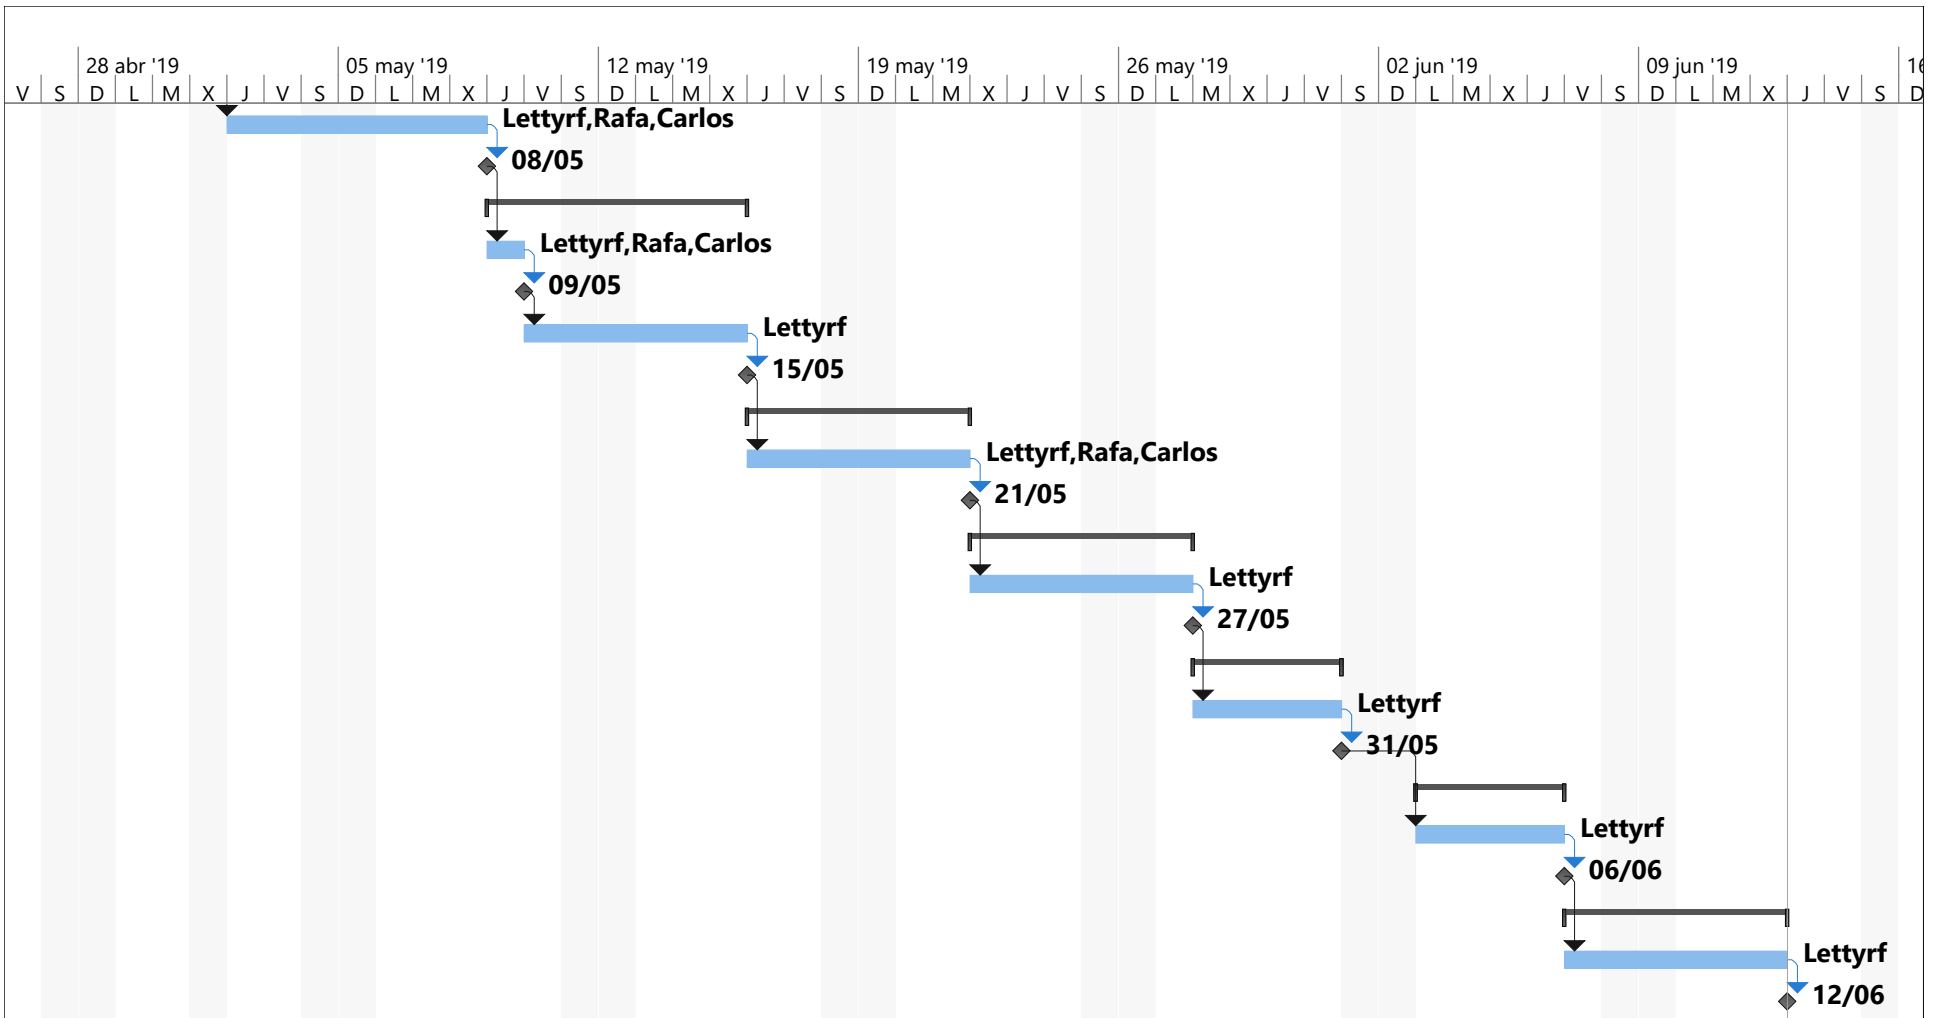

Proyecto: FirstBaseline_FabAcad Fecha: vie 25/01/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
